

Hanne Skjødt

Fra: svarikke@aarhus.dk
Sendt: 7. marts 2014 07:42
Til: MTM-VandmiljøogLandbrugNaturomMiljø
Cc: Verner Koop; MTM-Bygningsinspektoret
Emne: Færdigmelding af kloakarbejde på egen grund
Vedhæftede filer: Dybbølvej-29-Risskov--Kloakplan.pdf

Kategorier: HS

Denne færdigmelding omfatter kloakarbejde på følgende adresse:

Vejnavn: Dybbølvej

Nr. 29

Postnummer: 8240

By: Risskov

Kloakarbejdet er afsluttet: 07-03-2014

Firmanavn: Aage Wegener & Søn A/S

Kloakmester: Michael Elleby Nielsen


Kvittering sendt til: mn@aage-wegener.dk

Kloakeret område

Regn- og spildevand er adskilt i den private del af kloaksystemet

Regnvand afledes til:

Det åbne land

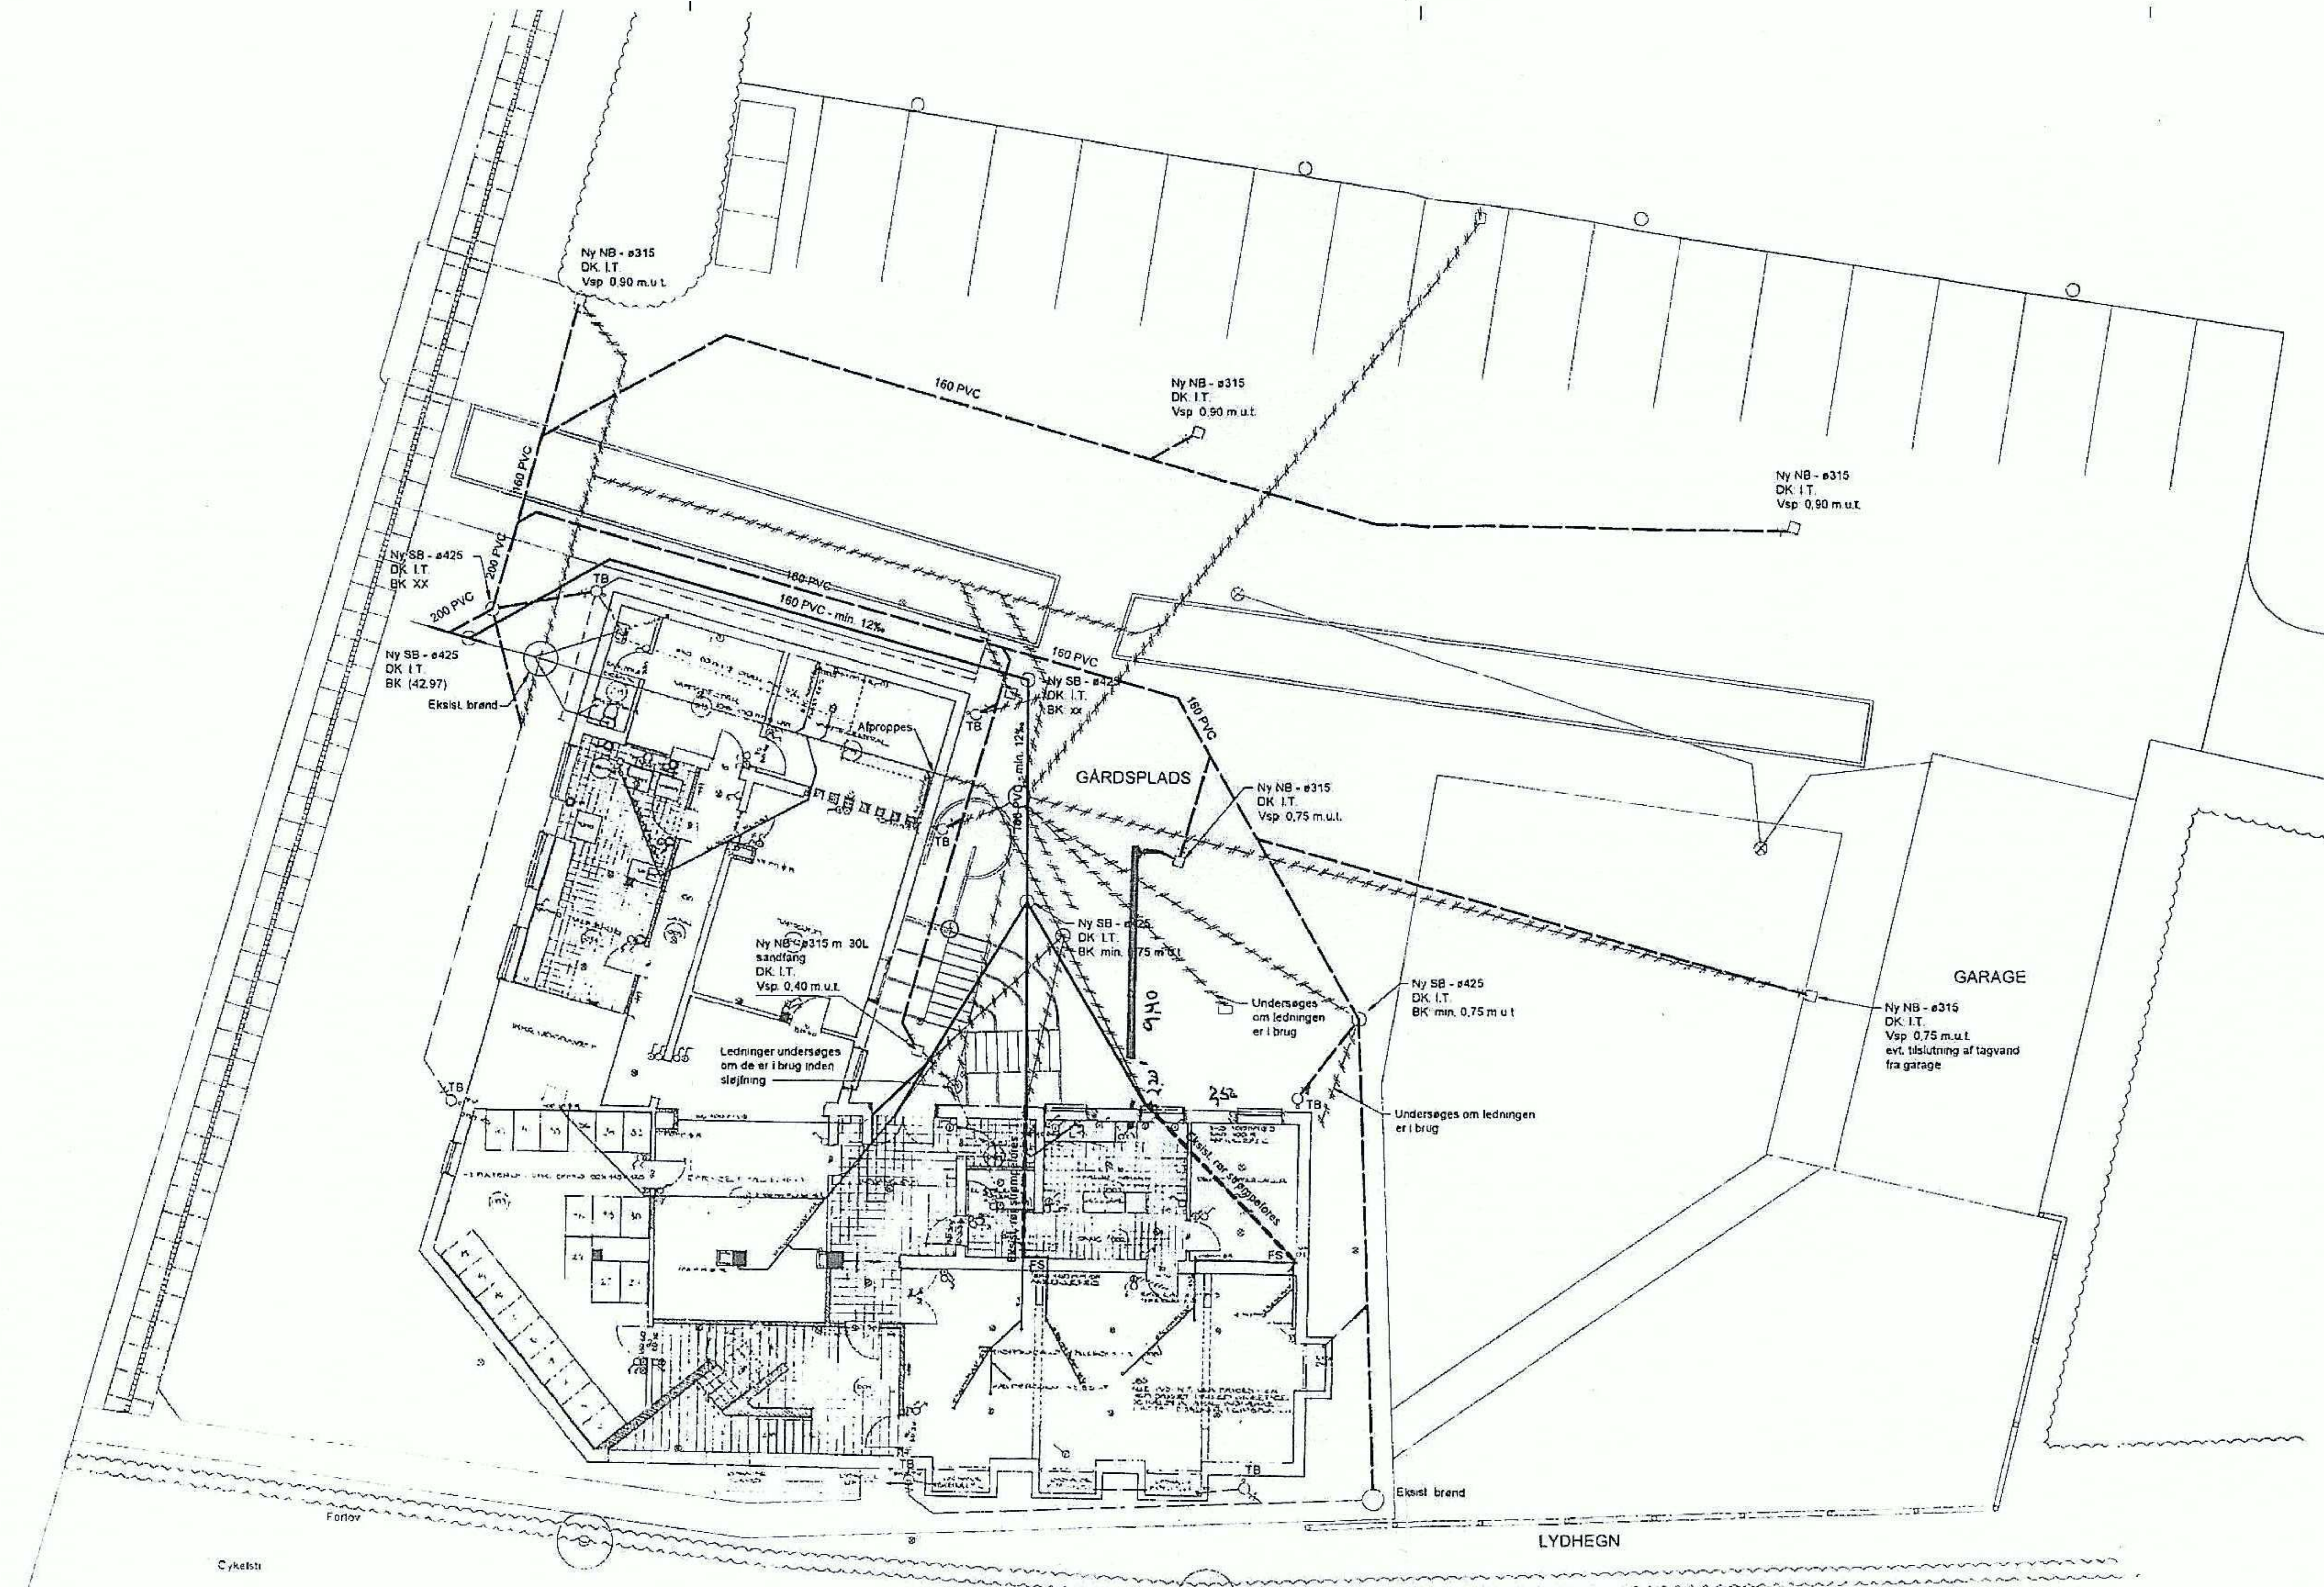

- NOTER OG SIGNATURER**
- Ny spildevandsledning
 - - - Eksisterende spildevandsledning
 - Ny regnvandsledning
 - - - Eksisterende regnvandsledning
 - - - Eksisterende dræning
 - - - Eksisterende sløjet regnvandsledning
 - - - Eksisterende sløjet spildevandsledning
 - Strømpeløring
 - NB Rendestensbrønd med 70L sandfang og vandlås
 - SB Spulebrønd ø315 og ø425 plast
 - DK Dæksekte
 - BK Bødningskote
 - IT I terræn
 - TB Eksisterende tagbrønd med sandfang og vandlås
 - FS Eksisterende faldstamme
 - m.u.L. Møler under terræn

ACO DMI

Alle afløbsledninger er kl. SN8.
 Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativsamt fabrikantvejledninger.
 Ubøvnede spildevandsledninger er ø110 med min. 20% fald
 Ubøvnede regnvandsledninger er ø100 med min. 10% fald
 Ubøvnede tørlødnings er ø110 med min. 20% fald
 Vandret fri afstand mellem krydsende ledninger skal være 0,5 m.
 Lodret fri afstand mellem krydsende ledninger skal være 0,2 m.
 Dækstøjer og niste føres i støjbjælm inkl. Kegel.
 Alle eksisterende ledninger skal spules for afløring.
 Alle nye ledninger skal spules inden afløring.

Retning
 Arbejdet skal udføres af et firma, som er medlem af NO-dig kontrolordningen for ledningsrenovering.
 Strømpeløringen dimensioneres, leveres og installeres af entreprenøren inkl. alle arbejder for fuld færdiggørelse.
 Der skal anvendes ikke skadefri, luftfri epoxy-harpiks.
 Eventuelle halprofilen skal være indeholdt.
 Indvendige demontering og genmontering af toiletter, vaskeskabe mv. som er nødvendige for arbejdets udførelse skal være indeholdt. Klargøring af ledninger inkl. rodklæring samt tv-inspektion efter arbejdets afslutning skal være indeholdt.

HENVISNINGER
 Eksisterende situationstegning, nr. 010
 Eksisterende kloakplan, nr. BK 02

BEMÆRK:
 Det er meget vigtigt, at alle koter verificeres inden arbejdet påbegyndes.
 Det skal sikres at der er tilstrækkelig disponibel fald.

A 2012.06.22 PMA/OT Afløbsledningsrenovering og udhuling			
Rev. No.	Dato	Proj. Tegn.	Beskrivelse
Grenåvej Kollegiet Dybbølvej 29, 8240 Riskov			
Emne Kloakplan			Tegn. nr. 200
Mål 1:100	Proj. Tegn. LOT/BSH	Sag nr. 44.256	
Dato 2012.06.07	KS Dato	Fåkrav 200 dwg	
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S		Stenvej 19 Postbox 1922 8270 Højbjerg	
		Tlf 86 27 39 44 Fax 86 27 87 24 Mail vrm@vming.dk	

Handwritten signature and date: H. Skjold 10.03.2014
